

今こんなことをしています。

★鶴岡市立朝陽第五小学校改築工事現場よりのお知らせ★

皆様には日頃より「第五小学校改築工事」につきましてご協力頂き心より感謝申し上げます。

現在、運動場棟(C棟)は基礎工事が一部完了し、①工区より埋戻しを行っております。埋戻し後は土間と残りの基礎を施工し、1階躯体工事へ進んでいきます。

管理棟(A棟)は①～②工区は基礎配筋型枠が完了し、基礎底盤のコンクリート打設へ進んでいきます。②～③工区は地足場組立後に基礎配筋を行っております

4月以降は校舎棟(B棟)の土工事や管理棟(A棟)・運動場棟(C棟)のコンクリート工事で大型車両が今まで以上に頻繁に出入り致します


近隣の皆様にはご迷惑をお掛け致しますがご理解と、ご協力頂けますようお願い申し上げます。

記

C棟①②工区	ア+土間コンクリート打設予定日	令和5年4月7日(金)
C棟①②工区	基礎カゴ部分打設予定日	令和5年3月15日(土)
C棟①②工区	共用部土間コンクリート打設予定日	令和5年4月28日(金)

A棟①工区	基礎コンクリート打設予定日	令和5年4月13日(木)
A棟①工区	スラブコンクリート打設予定日	令和5年5月1日(月)
A棟②③工区	基礎ピット底盤コンクリート打設予定日	令和5年4月21日(金)
A棟②工区	基礎コンクリート打設予定日	令和5年5月2日(火)

B棟③工区	基礎根切り開始予定日	令和5年4月7日(金)
B棟②工区	基礎根切り開始予定日	令和5年4月17日(月)

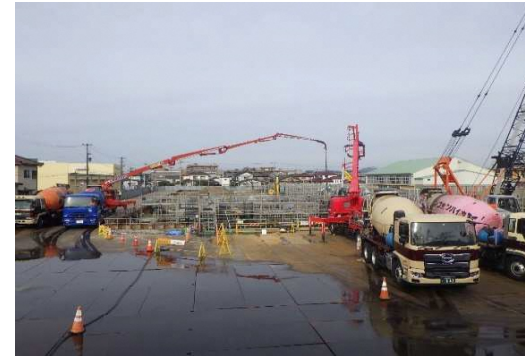

C棟基礎コンクリート打設



C棟埋戻し状況



C棟土間配筋状況



A棟墨出し状況



A棟基礎配筋状況



A棟型枠組立状況



現場担当の志藤 龍です。
私は五小を卒業しました。
母校の工事に携わることができ
大変うれしく思います。
後輩たちの為に頑張って良い品質の
建物を完成させます。
宜しくお願いします。

現在の工事進捗率 17%



基礎工事状況を上空から撮影した写真です。



各棟は工区を分けて施工します。
A棟 ①～③工区
B棟 ①～③工区
C棟 ①～②工区
D棟 ①工区

